


BouwNieuws voor omwonenden

22 september 2022

Omwonenden van de 11 windparken van Windplan Groen kunnen in 2022 en 2023 veel bouwactiviteiten ervaren. Soms is het even rustig, dan weer gebeurt er een tijdlang heel veel. Via BouwNieuws houden we u, als omwonende, de komende jaren regelmatig op de hoogte. Dat kan gaan over de demontage van windmolens, afvoer van onderdelen, maar ook de aanvoer van zand, beton en asfalt of van apparatuur of onderdelen voor de turbines.

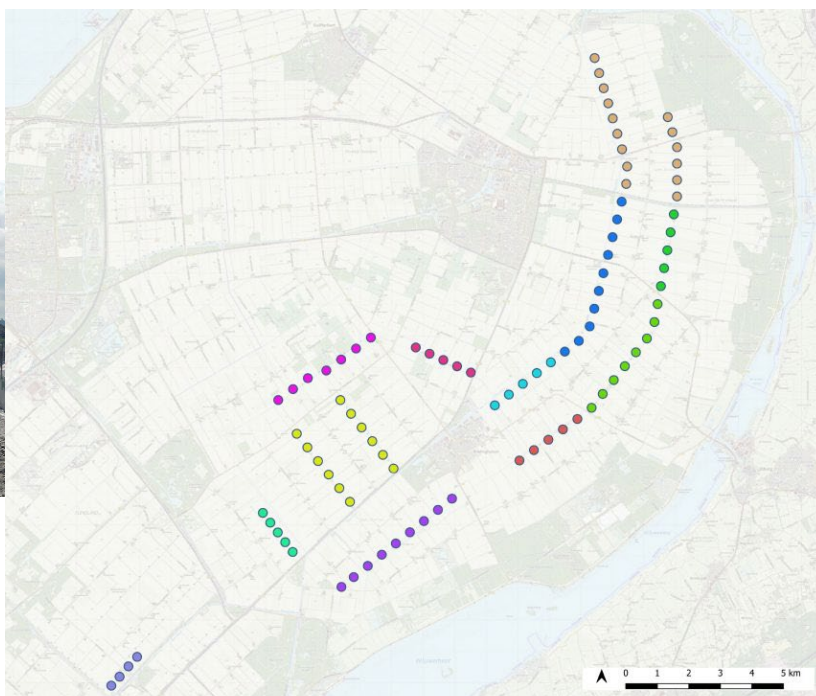

(Op de kaart vindt u de diverse windparken die in deze nieuwsbrief worden genoemd)

Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht en Hondtocht Zuid

De funderingen van Windpark Flevo Ventum zijn klaar. Bij Hoge Vaart Zuid wordt op sommige locaties geheid, terwijl op andere locaties het vlechten van het funderingsstaal en het betonstorten bezig is of zelfs al is afgerond.

Bij Oldebroekertocht is het heien gereed en staan het vlechtwerk en de betonstort voor de funderingen op de rol

Eind oktober staat het ploegen van de nieuwe parkkabels bij Windpark Hondtocht Zuid gepland. De verwachting is dat in november de eerste grondwerkzaamheden bij dit windpark beginnen.

Aanvoer onderdelen windmolens gaat beginnen

Als eerste stap voor de daadwerkelijke bouw komen binnenkort de eerste onderdelen op locatie aan. De mastdelen, wieken en gondels van de windmolens komen met speciale transporten. Dat gebeurt vaak in de avond en nacht om overig verkeer zo min mogelijk te hinderen.

De aanvoer van onderdelen begint bij Windpark Flevo Ventum. Zoals het nu lijkt, begint dat begin oktober. Daarna is Windpark Hoge Vaart Zuid aan de beurt. In die volgorde worden ook de windmolens gebouwd.

De aanvoer van onderdelen en bouw van de windmolens bij Windpark Oldebroekertocht begint zoals nu is beoogd in maart/april 2023. Bij Windpark Hondtocht Zuid volgt dit daarop aansluitend.

Alle onderdelen eerst richting Biddinghuizen

Alle onderdelen van de windmolens komen over snelwegen en provinciale wegen aan op de N305 (Biddingringweg) bij Biddinghuizen. Veel onderdelen komen per schip aan in de Flevokust Haven bij Lelystad en gaan dan per vrachtwagen via de N710, Rietweg en Harderringweg richting Biddinghuizen. De wieken komen per vrachtwagen vanuit Amsterdam over de N305 (Biddingringweg).

Windpark Hanze



Bij Windpark Hanze zijn de eerste heiwerkzaamheden begonnen. Dat is eind vorige week omlijst met een feestelijk tintje.

Kubbeweg

Terwijl bij Kubbeweg aan één zijde van het park voorbereidingen worden getroffen om materiaal aan te voeren, wordt bij andere locaties gewerkt aan de fundering.

XY Wind

Ook bij XY Wind worden voorbereidingen getroffen voor aanvoer van materiaal.

Ansjoisstroom

Bij Ansjoisstroom worden oude funderingen verwijderd en funderingsputten uitgegraven.
