

BouwNieuws voor omwonenden

7 november 2022

Omwonenden van de 11 windparken van Windplan Groen kunnen in 2022 en 2023 veel bouwactiviteiten ervaren. Soms is het even rustig, dan weer gebeurt er een tijdlang heel veel. Via BouwNieuws houden we u regelmatig op de hoogte. Dat kan gaan over de demontage van windmolens, afvoer van onderdelen, maar ook de aanvoer van zand, beton en asfalt of van apparatuur of onderdelen voor de turbines.

(Op de kaart op de laatste pagina vindt u de diverse windparken die in deze nieuwsbrief worden genoemd)

Hijskranen aangekomen; wachten op minder wind

Op meerdere locaties zijn hijskranen aangekomen voor de opbouw van windmolens. Het wachten is deze week op minder wind. Tot dat moment kunnen de grote kranen niet worden opgebouwd of gebruikt.



Oldebroekertocht en Ansjovisstroomb: Ankerkooi

Bij windpark Oldebroekertocht start na het heien, de bouw van de fundering. Centraal in die fundering komt de zogeheten ankerkooi. Op de 'pinnen' van die kooi wordt (zodra rondom beton is gestort) het onderste torendeel van een windmolen geplaatst.

Ook bij windpark Ansjovisstroomb worden de komende tijd nog ankerkooien geplaatst.



Kubbeweg


Bij windpark Kubbeweg is sprake van twee lijnen. Bij de eerste lijn (ZNT) worden voorbereidingen getroffen voor hijswerkzaamheden om de windmolens op te bouwen. Bij de andere lijn (KBT) wordt gewerkt aan afronding van de bekabeling en aanleg van tijdelijke verhardingen .

Windpark Hanze

Binnen windpark Hanze wordt langs de HVN-lijn gewerkt aan de funderingen na afronding van het heien. Langs de naastgelegen HTN-lijn worden de voorbereidingen getroffen voor de heimachine.

XY Wind

Bij XY Wind gaan de heiwerkzaamheden door voor de GE windmolens. Voor hetzelfde windpark rondt Vestas de bouw van drie lagere windmolens af, als de weersomstandigheden dat toestaan..

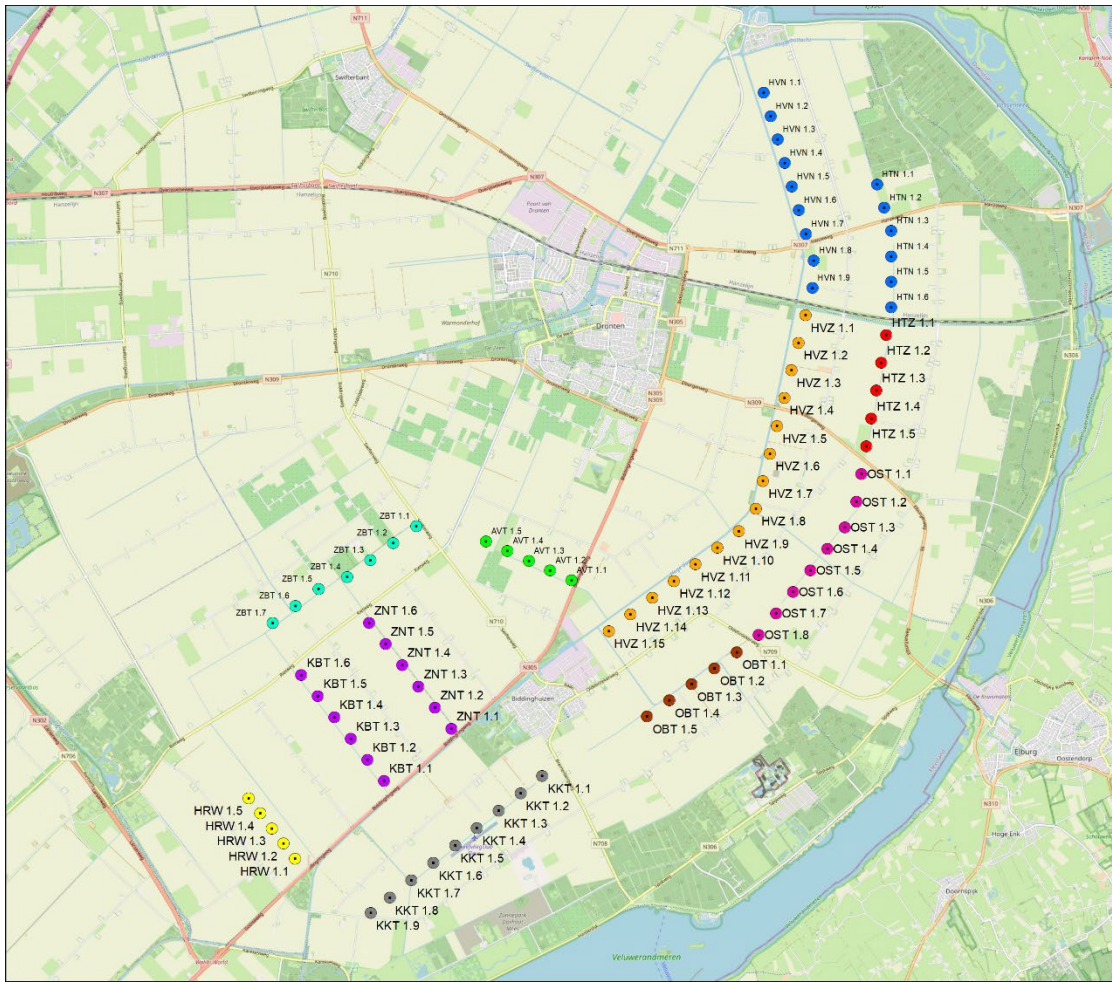

Legenda

- Ansjovisstroom
- Hanze
- Hoge Vaart Zuid
- Hondtocht 3
- Kubbeweg 2
- Oldebroeker -tocht 3
- Olsterwind
- Vires Venti
- XY Wind
- Zeebiestocht 2

